

	PROJETS EN COURS	MISE À JOUR
1.	ÉSC Hamilton	<p>Les dessins préliminaires sont complétés</p> <p>Demande de plan de site déposée le 28 septembre 2018</p> <p>Les commentaires des différentes agences de la ville de Hamilton ont été reçus le 14 novembre 2018</p> <p>Les études et les rapports d'identification des services ont été exécutés</p> <p>La demande de plan de site de Broughton a été réactivée</p> <p>L'architecte a commencé le processus de réalisation des différentes études et analyses exigées par la ville</p> <p>La 2^{ème} soumission est prévue au début de mars 2022</p> <p>Des analyses supplémentaires du sol ont été demandées par la ville</p> <p>Les études du sol ont été octroyées à Forward Engineering</p> <p>Études du sol achevés</p>
2.	ÉSC Sainte-Trinité (addition)	<p>Les dessins préliminaires sont complétés</p> <p>Rencontre de pré-consultation avec la ville d'Oakville le 3 octobre 2018</p> <p>La demande de variance a été entendue et approuvée le 15 janvier 2019</p> <p>La demande de plan de site a été soumise le 31 janvier 2019</p> <p>Le design est complété</p> <p>L'entente du plan de site est signée</p> <p>Le rapport de l'estimation de coûts a été complété</p> <p>Une stratégie d'exécution des travaux avec une école opérationnelle a été identifiée</p> <p>L'approbation du MÉO pour aller en appel d'offres est obtenue</p> <p>Permis pour l'ajout de 8 portatives sur le terrain pour accommoder la construction est obtenu</p> <p>L'appel d'offres pour la construction est lancé le 11 janvier 2021</p> <p>Les soumissions sont ouvertes le 23 février 2021</p> <p>Le contrat de construction a été octroyé</p> <p>Permis de construction obtenu en juin 2021</p> <p>Les travaux de maçonnerie des murs extérieurs au RDC sont complétés</p> <p>Le montage de la structure d'acier de la canopée ainsi que les colonnes du deuxième étage est terminé</p> <p>Les travaux mécaniques et électriques sont en cours</p> <p>Les dalles de béton pour le plancher du 2^{ième} étage sont installées</p> <p>La pose des blocs et l'installation des dalles en acier du toit sont complétés</p> <p>La base de la toiture est réalisée à 90% de manière à ce que le bâtiment soit étanche</p> <p>L'installation des gaines de ventilation et les tuyaux de chauffage sont en cours</p> <p>Les parapets sont faits en vue du début des travaux de toiture</p> <p>Les échafaudages sont en place pour la pose des briques et l'installation de la membrane sur les façades qui sont prévues la première semaine d'avril</p>

	PROJETS EN COURS	MISE À JOUR
		<p>L'installation de la tuyauterie de base pour les toilettes est complétée</p> <p>L'installation des cadres et fenêtres autour de l'addition est en cours</p> <p>La membrane et l'isolation sont en cours de préparation pour la pose des briques</p> <p>À l'intérieur, l'installation des cadres de portes et les 2 cages d'escaliers sont en cours</p> <p>Le béton a été coulé afin de créer le plancher du 2e étage</p> <p>L'installation des fenêtres est complétée</p> <p>La pose de La membrane et l'isolation est complétée</p> <p>La pose des briques du côté Grand Oak Tail est terminée. Du côté Dundas, elle est complétée à 100%</p> <p>Le béton du plancher du rez-de-chaussée de la nouvelle addition est coulé</p> <p>Les structures en acier pour les murs intérieurs au deuxième étage sont en place et prêtes pour les placards en gypseum</p> <p>Les deux cages d'escaliers sont en cours d'installation</p> <p>La pose des briques est complétée à 100%</p> <p>L'installation des murs intérieurs au 2ème étage en gypse et blocs est complétée</p> <p>L'installation des plafonds suspendus ainsi que les lumières a débuté</p> <p>L'installation des équipements des chaudières est complétée</p> <p>Les montages d'acier pour les écrans de toiture sont en place</p> <p>Le béton dans les cages d'escaliers est en cours de coulage</p> <p>Les inspections mécaniques et électriques au-dessus des plafonds sont en cours</p> <p>Début des travaux de peinture et pose de planchers débuteront la semaine du 10 octobre 2022</p> <p>Les travaux des gros œuvres sont achevés</p> <p>Les unités de ventilation sur le toit sont installées</p> <p>Les essais de mise en marche des systèmes mécanique et électrique sont en cours</p> <p>Les travaux de paysagement sont terminés</p> <p>L'installation des planchers est terminée</p> <p>Les travaux de finition achevés à 90% (peinture, faux plafonds, équipements électriques)</p> <p>L'installation des armoires et menuiserie est en cours</p> <p>Les travaux de finition achevés à 100%</p> <p>L'installation des armoires et menuiserie est terminée</p> <p>Travaux achevés</p> <p>Lettres de recommandation préparée par l'architecte et en cours de transmission à la ville pour avoir l'occupation du bâtiment</p> <p>On a eu le permis d'occupation et l'école est maintenant fonctionnelle</p> <p><u>Septembre 2023 :</u></p> <p>Déficiences en cours de rectification</p>

	PROJETS EN COURS	MISE À JOUR
3.	ÉSC Vaughan et garderie	<p>Les plans préliminaires sont complétés</p> <p>La rencontre préliminaire avec les différentes agences municipales est prévue le 25 octobre 2019</p> <p>Le permis de démolition du bâtiment existant est obtenu</p> <p>Le contracteur de démolition a été sélectionné suite à l'appel d'offres</p> <p>Les travaux de démolition sont finis</p> <p>La préparation du site pour la construction est en cours</p> <p>Le plan de site a été approuvé le 9 juin 2020</p> <p>L'estimé des coûts est préparé</p> <p>Préparation des documents de demande d'aller en appel d'offres au MEO sont en cours</p> <p>L'estimé des coûts est complété</p> <p>La demande d'aller en appel d'offres a été envoyée au MEO</p> <p>L'entente du plan de site a été signée et approuvée par la ville</p> <p>La préparation des documents d'appel d'offres est en cours</p> <p>En attente de l'octroi du permis de construction</p> <p>En attente de l'approbation du MEO pour aller en appel d'offres</p> <p>Le conseil a reçu l'approbation du ministère pour aller en appel d'offres</p> <p>Les appels d'offres sont rentrés au-dessus du budget alloué.</p> <p>L'administration a débuté la négociation avec le plus bas soumissionnaire</p> <p>Une demande de financement additionnel a été envoyée au MEO le 30 mai 2022</p> <p>Le MEO a accordé des fonds additionnels</p> <p>Le contrat de construction a été accordé au plus bas soumissionnaire</p> <p>Les travaux de fondations et de connexions aux services municipaux sont en cours</p> <p>Travaux de fondation sont complétés à 100%</p> <p>Les travaux de maçonnerie et structure du premier étage sont complétés à 100%</p> <p>Les réseaux sous dallage sont complétés à 100%</p> <p>Les travaux de raccordement des réseaux d'assainissement et d'eau pluviales sont achevés</p> <p><u>Octobre 2023</u></p> <p>Les travaux d'élévation du deuxième étage sont complétés à 100%</p> <p>Les travaux de la toiture sont complétés à 100% et les unités sur le toit (RTU) sont installées</p> <p>Travaux de voiries et réseaux d'assainissement et eau potable sont complétés à 90%</p> <p>Travaux d'isolation des murs extérieurs et de revêtement des façades en cours 70%</p> <p>Les travaux de finition sont en cours</p> <p><u>Novembre 2023 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Travaux de réseaux d'assainissement et eau potable sont complétés - Travaux d'asphalte et dallage extérieur en cours

	PROJETS EN COURS	MISE À JOUR
		<ul style="list-style-type: none"> - Travaux de paysagement extérieur en cours - Travaux d'isolation des murs extérieurs et de revêtement des façades complétés à 80 % - Les travaux de revêtement du sol et peinture des murs en cours <p><u>Janvier 2024 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Travaux de voiries sont complétés. Première couche d'asphalte appliquée - Travaux d'isolation des murs extérieurs et de revêtement des façades en cours 95% - Les travaux de finition sont en cours 70 % - Les travaux de raccordement, d'essais de démarrage du système mécanique en cours <p><u>Février 2024</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Travaux d'isolation des murs extérieurs et de revêtement des façades en cours 97 % - Les travaux de finition sont en cours 90 % - Les travaux de raccordement, d'essais de démarrage du système mécanique toujours en cours <p><u>Mars 2024</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Travaux d'isolation des murs extérieurs et de revêtement des façades en cours 97 %</i> - <i>Les travaux de finition du bâtiment sont en cours 95%</i> - <i>Les travaux de raccordement, et les essais de démarrage du système RTU Terminé.</i>
4.	Projets de garderies :	<p>La firme d'architectes a été sélectionnée le 23 novembre 2018</p> <p>Les dessins préliminaires sont complétés</p> <p>Les démarches des plans de site avec les villes sont entamées</p> <p>Les plans ont été présentés aux responsables des services de gardes</p>
5.	<u>Service de garde à l'ÉEC Saint-Michel</u>	<p>Le design est à 90%</p> <p>La ville de Toronto a signé l'entente conjointe le 30 octobre 2019</p> <p>L'approbation MÉO du plan de l'étage a été obtenue</p> <p>Approbation du MÉO pour aller en appel d'offres obtenue</p> <p>Le permis de construction est obtenu</p> <p>Les documents d'appel d'offres sont en cours de préparation</p> <p>L'appel d'offres a été lancé le 9 février 2021</p> <p>Le montant du plus bas soumissionnaire est plus élevé que le montant alloué pour la construction.</p> <p>L'administration doit donc reporter ce projet. Il sera relancé sur le marché en janvier 2022</p> <p>Des fonds additionnels ont été octroyés par le MÉO</p> <p>Le projet a débuté en juillet 2021</p> <p>Les travaux de connexion exécutés par Enbridge ont été complétés début septembre 2021</p> <p>Les travaux de rénovation du local de la pouponnière sont complétés à 100%</p> <p>Les fondations sont coulées pour l'agrandissement</p> <p>Les murs extérieurs sont terminés</p>

	PROJETS EN COURS	MISE À JOUR
		<p>Les travaux de toiture sont en cours avec la pose des poutrelles métalliques Le permis d'occupation partiel de la pouponnière a été obtenu le 21 mars 2022 Le coulage de la dalle intérieure est terminé La pose des fenêtres est en cours et les travaux de l'étanchéité du toit ont débuté Les travaux de câblage électriques ont commencé La pose de la membrane de protection est complétée La pose des briques de parement débutera la semaine du 6 juin 2022 La maçonnerie intérieure est terminée à 100% Les travaux de gros œuvres achevés L'étanchéité des terrasses et de fenêtre en cours de finition Les travaux de paysagement et terrassement ont débutés la semaine du 21 novembre 2022 L'installation des armoires et menuiserie est en cours Les travaux de finition sont en cours Les travaux de l'addition sont achevés à 100% L'accès aux portatives est opérationnel Le permis d'occupation est obtenu Les travaux de paysagement et la pose du gazon sont à compléter au mois de juin La correction des déficiences est en cours Les déficiences sont adressées <u>Octobre 2023 :</u> Finalisation du contrat avec contracteur en cours</p>
6.	<p>Service de garde à l'ÉEC Saint-Jean-Baptiste</p>	<p>Le design est à 100% L'approbation MEO du plan de l'étage a été obtenue L'approbation du MEO pour aller en appel d'offres est obtenue Les documents d'appel d'offres sont en cours de préparation La région de Peel a approuvé les plans Le permis de construction a été octroyé L'appel d'offres pour la construction est lancé le 21 mars 2022 Les soumissions sont rentrées au-delà du budget alloué. Le projet sera donc tablé et relancé une autre fois à l'automne 2022 L'appel d'offres pour un deuxième lancement est en préparation L'appel d'offres a été lancé le 30 novembre 2022 Les soumissions dépassent le budget alloué par le MEO Une demande de fonds additionnels a été envoyée au MEO le 10 janvier 2023 Des fonds additionnels sont octroyés par le MEO</p>

	PROJETS EN COURS	MISE À JOUR
		<p>Le contrat a été octroyé au plus bas soumissionnaire. Les travaux de construction sont en cours. Les travaux de raccordement en eau potable et eaux pluviales sont achevés Les travaux de raccordement au réseau de gaz sont achevés Travaux de fondation achevés. <u>Octobre 2023 :</u> Réseau sous dallage et dallage achevés. <u>Novembre 2023 :</u> Travaux des élévations et murs porteurs en cours <u>Janvier 2024 :</u> Travaux d'enveloppe extérieure achevés. Travaux d'isolation du toit en cours. Travaux mécaniques et électriques en cours. <u>Février 2024 :</u> Travaux d'isolation du toit en cours 25%. Travaux mécaniques et électriques en cours 40%</p> <p><u>Mars 2024 :</u> <i>Travaux d'isolation du toit en cours 90%</i> <i>Travaux mécaniques et électriques en cours 60%</i></p>
7.	Service de garde à l'ÉEC Sainte-Madeleine	<p>La firme d'architectes a été sélectionnée le 22 juillet 2021 Le plan d'étage a été approuvé par le MEO Le design détaillé est en cours Le permis de construction est en cours de négociation avec la ville La demande d'aller en appel d'offres a été soumise au MEO Le conseil a reçu l'approbation du MEO pour aller en appel d'offres L'appel d'offres est en préparation pour un lancement en novembre 2022 L'appel d'offres pour la sélection de l'entrepreneur général a été lancé le 17 novembre 2022 Les soumissions dépassent le budget alloué par le MEO La demande de fonds additionnels a été acceptée par le MEO et la lettre d'intention est envoyée au plus bas soumissionnaire pour signature. Le contrat a été octroyé au plus bas soumissionnaire Les travaux de construction commenceront en juillet 2023. <u>Octobre 2023 :</u> Travaux de maçonnerie sont achevés.</p>

	PROJETS EN COURS	MISE À JOUR
		<p>Travaux mécanique et électrique sont en cours à 85%. Travaux de menuiserie sont en cours à 30 %.</p> <p><u>Novembre 2023 :</u> Travaux mécanique et électrique sont complétés à 90%. Travaux de menuiserie sont en cours à 90 %. Travaux de revêtement du sol en cours à 95%. Travaux de peinture en cours à 15%.</p> <p><u>Janvier 2024 :</u> Travaux de finition achevés. Travaux mécanique et électrique sont en cours à 98%.</p> <p><u>Février 2024 :</u> Travaux électriques sont achevés. Travaux mécaniques sont en cours d'achèvement.</p> <p><u>Mars 2024 :</u> <i>Travaux électriques achevés</i> <i>Inspection de la ville effectuée et déficiences travaux électriques en cours de réparation</i> <i>Travaux mécaniques en cours d'achèvement</i></p>
8.	Service de garde à l'ÉEC du Sacré-Cœur - Toronto	<p>La firme d'architectes a été sélectionnée le 22 juillet 2021 Le plan d'étage a été approuvé par le MEO Le design détaillé est en cours Le permis de construction est octroyé La demande d'aller en appel d'offres a été soumise au MEO pour avis seulement L'appel d'offres sera lancé à la mi-avril 2022 Les soumissions sont rentrées au-delà du budget alloué Une demande de fonds additionnels a été soumise au MEO en juin 2022. L'appel d'offres est en préparation pour un lancement en novembre 2022 L'appel d'offres pour la sélection de l'entrepreneur général a été lancé le 17 novembre 2022 Le contrat a été octroyé au plus bas soumissionnaire Les travaux débuteront en juillet 2023 Le permis d'occupation partiel est obtenu pour l'utilisation des toilettes des filles</p> <p><u>Octobre 2023 :</u> Travaux achevés 98% Les lettres de recommandations ont été soumises à la ville pour permis d'occupation complet</p> <p><u>Novembre 2023 :</u></p>

	PROJETS EN COURS	MISE À JOUR
		<p>Permis de construction est fermé avec la ville Le service de garde entame ses démarches pour l'obtention du permis du ministère de l'Éducation <u>Janvier 2024 :</u> Les travaux sont achevés et le permis est fermé. La garderie commencera le service le 05 février 2024 <u>Février 2024</u> Rectification des déficiences en cours</p>
9.	<p><u>Service de garde à l'ÉEC Sainte-Marguerite-Bourgeoys - Brantford</u></p>	<p>La firme d'architectes a été sélectionnée le 9 novembre 2021 Le design préliminaire est terminé Le plan d'étage a été approuvé par le MEO Le design détaillé est en cours Le permis de construction est en cours de négociation avec la ville Une revue du plan de site est demandée par la ville La demande du plan de site a été resoumise à la ville en septembre 2022 En attente des commentaires de la ville de Brantford concernant la demande du plan de site Les réponses aux commentaires sur le plan de site ont été soumises à la ville Les plans sont en cours finalisation à 95% Le dossier du permis de construction a été déposé à la ville le 26 janvier 2023 L'estimation de coûts est achevée La demande d'aller en appel d'offres incluant une demande de fonds additionnels a été approuvé par le MEO En attente des commentaires de la ville pour le permis de construction et le plan de site. Commentaires reçus de la ville pour la troisième fois avec exigence d'une étude archéologique (Stage 01)</p> <p><u>Octobre 2023 :</u> Étude archéologique phase 1 achevée Troisième soumission au SPA en cours de préparation</p> <p><u>Novembre 2023 :</u> Discussion avec la ville en cours suite à leur demande d'effectuer la phase 2</p> <p><u>Janvier 2024 :</u> Étude archéologique (stage 01) achevée Troisième soumission du plan de site en novembre 2023</p>

	PROJETS EN COURS	MISE À JOUR
		<p>L'étude archéologique stage 02 exigée par la ville sera faite dès que les conditions météorologiques le permettent (Avril-Mai 2024) <u>Février 2024</u> L'étude archéologique stage 02 à venir Travaux topographiques préparatoires pour l'étude en cours</p> <p><u>Mars 2024 :</u> <i>Étude archéologique stage 2 achevée</i> <i>Rapport de l'étude et lettre du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport en cours de préparation</i></p>
10.	<p>Agrandissement de l'ÉEC Saint-Michel</p>	<p>L'appel d'offres pour sélection d'architectes est lancé le 4 février 2022 Le gabarit des espaces est en cours d'approbation par le MEO Contrat octroyé à la firme d'architectes Le design préliminaire est en cours de préparation Le processus de plan de site est en cours</p> <p>Vérification de zonage est faite et une demande de plan de site n'est pas nécessaire La demande de permis de construction est en préparation La demande de permis de construction a été déposée à la ville L'estimation de coûts est en cours d'analyse Le permis de construction octroyé par la ville de Toronto La demande d'aller en appel d'offres incluant une demande de fonds additionnels a été envoyée au MEO Financement additionnel approuvé par le MEO <u>Septembre 2023</u> Financement additionnel approuvé par le MEO Documents d'appel d'offres en cours de préparation <u>Octobre 2023</u> Lancement de l'appel d'offres pour un contracteur est prévu pour novembre 2023 <u>Novembre 2023 :</u> Étude de système de gicleurs à rajouter au projet <u>Janvier 2024 :</u> Documents d'appel d'offres en cours de révision suite à la révision du système de gicleurs Lancement de l'appel d'offres pour un contracteur est prévu pour février 2024 <u>Février 2024 :</u> Documents d'appel d'offres en cours de finalisation au bureau des architectes</p>

	PROJETS EN COURS	MISE À JOUR
		<p>Lancement de l'appel d'offres pour un contracteur sera fait lorsque les documents finaux seront reçus</p> <p><u>Mars 2024 :</u> <i>Documents d'appel d'offres finalisés</i> <i>Appel d'offres des travaux en cours de lancement</i> <i>Ouverture des plis prévue pour le 1^{er} mai 2024</i></p>
11.	<p><u>Aggrandissement de L'ÉEC Saint-René-Goupil</u></p>	<p>L'appel d'offres pour sélection d'architectes est lancé le 4 février 2022 Le gabarit des espaces est en cours d'approbation par le MEO Contrat octroyé à la firme d'architectes Le design préliminaire est en cours de préparation Le processus de plan de site est en cours Les réponses aux commentaires de la ville sur le plan de site sont en cours de préparation Des études complémentaires demandées par la ville sont en cours d'élaboration Un permis de déplacement des portatives va être soumis séparément</p> <p><u>Août 2023 :</u> Première soumission au SPA (L'application au plan de site) a eu lieu le 04 Aout 2023</p> <p><u>Sept 2023 :</u> Commentaires de la ville de la première soumission reçues le 12 septembre 2023</p> <p><u>Novembre 2023 :</u> Places additionnelles de stationnement exigées par la ville Le plan du site en cours de préparation pour la deuxième soumission au SPA</p> <p><u>Janvier 2024 :</u> La deuxième soumission du plan de site a été faite le 1er février 2024</p> <p><u>Février 2024 :</u> En attente des observations de la ville concernant le plan de site soumis Préparation de l'estimation par un spécialiste est en cours</p> <p><u>Mars 2024 :</u> <i>Observation de la ville reçue, en cours de traitement par l'architecte</i> <i>Soumission finale à la ville prévue pour le mois d'avril</i> <i>Estimation finalisé et l'ATP en cours de préparation</i></p>
12.	<p><u>Nouvelle école secondaire catholique Brampton</u></p>	<p>Gabarit des espaces approuvé par le MEO Le processus de morcellement du terrain est en cours Appel d'offres pour choix d'architectes en cours de préparation L'appel d'offres pour le choix d'architectes a été lancée le 5 avril 2023. L'offres de service architectural a été octroyé à la compagnie d'architectes Snyder.</p>

	PROJETS EN COURS	MISE À JOUR
		<p>La réunion de démarrage des études est en cours de préparation.</p> <p><u>Septembre 2023 :</u> Phase design schématique en cours de réalisation.</p> <p><u>Octobre 2023 :</u> Étude topographique achevé.</p> <p><u>Novembre 2023 :</u> Soumission du dossier du site plan à l'examen préliminaire faite le 06 novembre 2023.</p> <p><u>Janvier 2024 :</u> Réunion de préconsultation pour le Site Plan a eu lieu le 19 décembre 2023. Commentaires de la ville en cours de traitement.</p> <p><u>Février 2024 :</u> Commentaires de la ville concernant la préconsultation pour le plan de site en cours de traitement par les architectes Etude géotechnique en cours Etude environnementale en cours</p> <p><u>Mars 2024 :</u> <i>Commentaires de la ville concernant la préconsultation pour le plan de site en cours de traitement par les architectes</i> <i>Etude géotechnique en cours</i> <i>Etude environnementale en cours</i> <i>Etude de trafic en cours</i> <i>Etude de bruit en cours</i></p>
13.	<p>Nouvelle école élémentaire catholique Mississauga Ouest</p>	<p>Gabarit des espaces en cours d'approbation par le MEO</p> <p>Gabarit des espaces est approuvé par le MEO le 26 octobre 2022</p> <p>Appel d'offres pour architectes a été lancé le 7 novembre 2022</p> <p>Le contrat pour la firme d'architectes est octroyé le 19 décembre 2022.</p> <p>Le design préliminaire est complété.</p> <p>La rencontre préliminaire avec les différents départements de la ville a eu lieu le 11 avril 2023</p> <p>Commentaires formels de la ville reçu pour donner suite à la rencontre préliminaire</p> <p>SPA en cours de préparation à la lumière de ces observations</p> <p>Première soumission au PAM1 a eu lieu le 14 Aout 2023</p> <p>Deuxième soumission au PAM2 en cours de préparation à la suite des observations reçus de la ville.</p>



	PROJETS EN COURS	MISE À JOUR
		<p><u>Octobre 2023 :</u> Troisième soumission au PAM3 faite le 6 octobre 2023. Une rencontre de consultation avec les voisins, exigée par la ville, a eu lieu le 18 octobre</p> <p><u>Novembre 2023</u> Soumission du plan de site « Site Plan Application » le 13 novembre 2023</p> <p><u>Janvier 2024 :</u> Soumission au Site Plan Application le 19 janvier 2024. En attente des observations officielles de la ville Demande d'approbation pour aller en appel d'offres a été envoyée au MEO en incluant une demande de fonds additionnels le 17 janvier 2024</p> <p><u>Février 2024 :</u> Soumission du dossier de permis de construction à la ville. En attente des observations de la ville concernant le plan de site et le permis de construction. En attente de l'approbation ministérielle sur la demande de fonds et le lancement de l'appel d'offre</p> <p><u>Mars 2024 :</u> <i>Soumission du dossier de permis de construction à la ville Le site plan approuvé sous condition. La lettre de crédit et les dépôts de sécurité transmis à la ville, et l'agrément en cours de préparation En attente de l'approbation ministérielle sur la demande de fonds et le lancement de l'appel d'offre</i></p>
14.	<p><u>Nouvelle école élémentaire catholique Cobourg</u></p>	<p>Gabarit des espaces en cours d'approbation par le MEO Gabarit des espaces est approuvé par le MEO le 15 novembre 2022 Appel d'offres pour architectes est en cours de préparation L'appel d'offres pour une firme d'architectes est lancé le 23 décembre 2022. Le contrat pour la firme d'architectes est octroyé le 16 février 2023.</p> <p><u>Septembre 2023 :</u> Études architecturales en cours d'élaboration. La réunion de préconsultation sur le plan de site a eu lieu le 5 juillet 2023. La première soumission au SPA en cours de préparation.</p> <p><u>Octobre 2023 :</u> Dossier d'approbation par le MEO du design des locaux du service de garde en cours d'approbation.</p> <p><u>Novembre 2023 :</u> Plan du service de garde est finalisée le 24 novembre 2023 et sera envoyée au MEO pour obtenir l'approbation</p>

	PROJETS EN COURS	MISE À JOUR
		<p><u>Janvier 2024 :</u> La première soumission au SPA en cours de préparation. En attente de l'approbation du MÉO sur les plans des locaux du service de garde.</p> <p><u>Février 2024 :</u> La première soumission au plan de site en cours de préparation. En attente toujours de l'approbation du MÉO sur les plans des locaux du service de garde. Un rappel a été envoyé à la conseillère de programme au MÉO.</p> <p><u>Mars 2024 :</u> <i>La première soumission au plan de site en cours de préparation</i> <i>Etudes achevées a 80%</i> <i>En attente toujours de l'approbation du MÉO sur les plans des locaux du service de garde. Un rappel a été envoyé à la conseillère de programme au MÉO</i></p>
15.	Nouvelle école élémentaire à Brooklin	<p><u>Mars 2024 :</u> <i>L'appel d'offre pour la firme d'architectes a été lancé</i> <i>Processus de choix des architectes en cours</i></p>

Nouvelle école secondaire catholique de Vaughan



Agrandissement du service de garde à l'École élémentaire catholique Saint-Jean-Baptiste, Mississauga

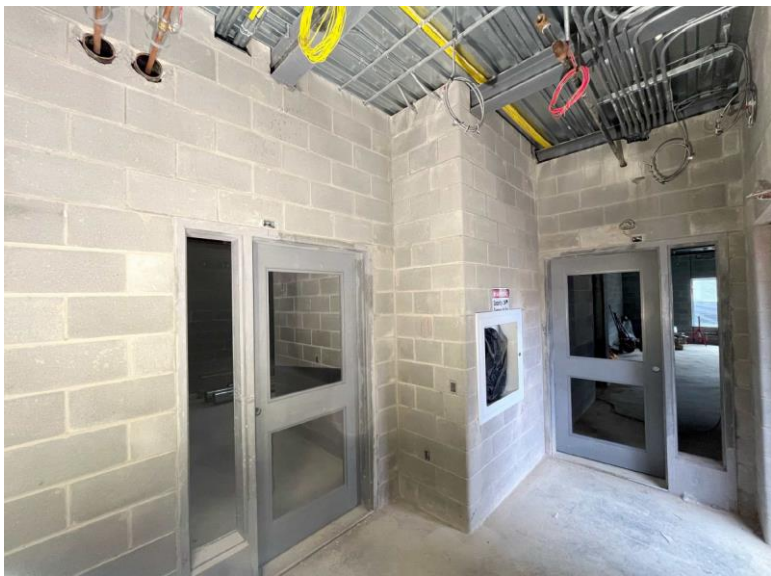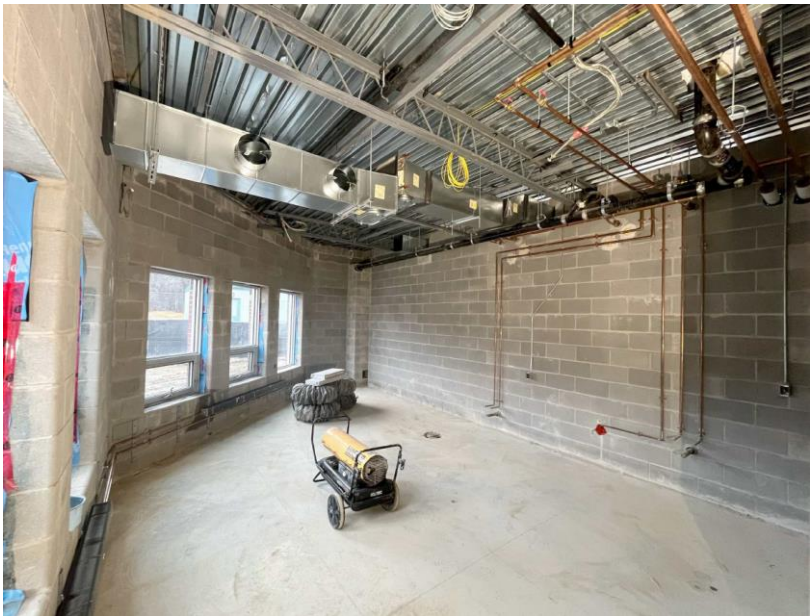

Rénovation du service de garde à l'École élémentaire catholique Sainte-Madeleine, Toronto

